

# 구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목	경로당 시설개선(안전한 경로당 만들기)			관리번호	3-2-1
주관부서	사회복지과	팀 장	행정6급 김미숙 (☎4343)	관련부서	-
		담당자	시설7급 김윤경 (☎4346)		
사업기간	2022 ~ 2026 [임기 후 계속]		소요예산	6,207백만원(시비12, 구비6,195)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)		진 도	22.5% (=실적/추진과제)	
공약목표	○ 안전하고 쾌적한 경로당 운영을 위한 체계적 보수공사 추진				
추진과제	○ 2023. 상반기 사업 실시설계 및 개보수공사 추진 - 2022년 개보수공사 후순위 대기 경로당 ○ 2024. 사업대상 선정을 위한 수요조사 및 실시설계 실시 ○ 경로당 신축·리모델링 공사 단계별 추진				

## 1. 추진개요

- 2023년도 경로당 개보수 공사 추진
  - 1차 공사 : 한파피해 등 긴급공사 6개소
  - 2차 공사 : 2022. 수요조사 결과 우선 판정대상 11개소
  - 3차 공사 : 2022. 수요조사 결과 우선 판정대상 8개소
- 2024년도 경로당 개보수 대상 조사
  - 수요조사, 선정(현장확인), 실시설계용역, 익년도 예산확보
- 경로당 신축·리모델링 공사 단계별 추진

## 2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	6,207	142	2,399	2,890	536	240	
	국비							
	시비	12	6	6				
	구비	6,195	136	2,393	2,890	536	240	
	기타							
투입 예산	총계	1,392	139	1,253				
	국비							
	시비	12	6	6				
	구비	1,380	133	1,247				
	기타							

### 3. 추진실적

#### ○ 2023년 경로당 개보수 공사 추진

- ▷ 2023년 경로당 개보수 공사(1차) 준공 ( '23.3.28.)
  - 한파피해 우려 및 민원사항 등 6개소 개보수
- ▷ 2023년 경로당 개보수 공사 실시설계용역 준공 ( '23.4.13.)
  - 19개소(2022년 수요조사 결과 우선판정 대상)
- ▷ 2023년 경로당 개보수 공사(2차) 준공 ( '23.7.3.)
  - 하정경로당 등 11개소 개보수
- ▷ 2023년 경로당 개보수 공사(3차) 준공 ( '23.10.31.).
  - 죽전경로당 등 7개소 개보수

#### ○ 2024년 경로당 개보수 대상 수요조사 및 추진

- ▷ 2024년 경로당 개보수 수요조사(자가진단) 완료
  - 경로당 49개소 신청(도배, 장판교체, 방수공사, 외벽도색 등)
- ▷ 2024년 경로당 개보수 현장조사(동 협조) 실시
  - 수요조사 신청 경로당 49개소 현장조사 완료
- ▷ 2024년 경로당 개보수공사 대상지 선정
  - 개보수 대상 41개소 우선순위 선정('23년 공사 중복신청 8개소 제외)
- ▷ 2024년 경로당 개보수공사 실시설계용역 발주
  - 개보수 대상 41개소 실시설계용역
  - 공사비 산출 및 '24년도 본예산 편성(240,000천원)

#### ○ 경로당 건립(신축 및 리모델링) 추진

- ▷ 서3동 윤산경로당 건립(신축) 준공 ( '23.3월)
  - 서동 36-50, 지상3층, 연면적 128.28㎡
- ▷ 청룡동 경로당 건립(증축 및 리모델링) 준공 ( '23.12월)
  - 청룡동 42-10, 지하1층/지상1층, 연면적 129.25㎡
- ▷ 구서2동 경로당 건립(리모델링) 설계용역 ( '23.11월~)
  - 구서동 158-18, 지상2층, 연면적 140.23㎡
- ▷ 금성동 경로당 건립(신축) 추진 ( '24년 본예산)
  - 금성동 관내 , 지상2층, 연면적 약150㎡, 기존건물 철거 후 신축
- ▷ 선두구동 경로당 건립(신축) 추진 ( '24년 본예산)
  - 두구동 252, 지상1층, 연면적 약200㎡, 기존건물 철거 후 신축

#### 4. 추진상 문제점 및 대책


- 경로당의 전반적인 노후 정도 심화로 개보수 대상 지속 발생
- 경로당별 전수조사 및 객관적 배점에 따라 체계적 개보수 추진  
(계획 → 대상 선정 → 실시설계용역 및 익년도 예산 상정)

#### 5. 향후계획

- '24년 1월~ : 경로당 신축·리모델링 공사 단계별 추진
- '24년 1월~ : 2024년 경로당 개보수 공사 추진
- '24년 3월~ : 2025년 경로당 개보수 대상 수요조사 실시
- '24년 6월~ : 2025년 경로당 개보수 공사 실시설계용역 실시

#### 6. 기타 참고사항(관련사진 등)


##### ○ 경로당 개보수공사 전·후

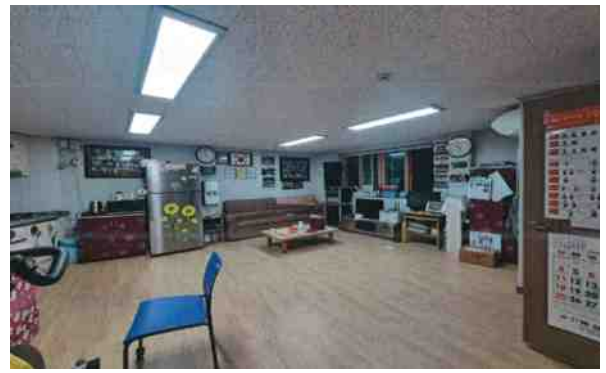

희망오차경로당 (도배)



서3동경로당 (2층 난간대 신설)

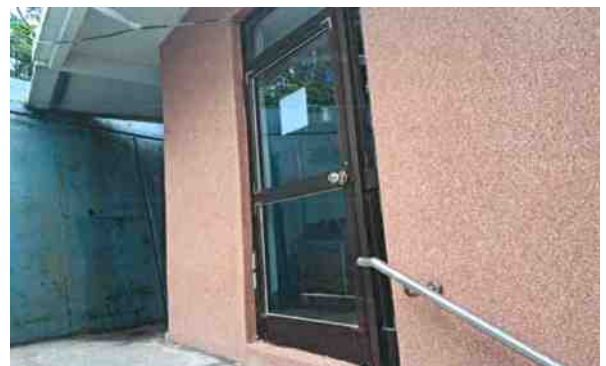

삼한그린피아경로당 (외벽 드라이비트 시공)
